



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.**  
**ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**  
**EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION: 24/05/2019  
 MES QUE SE REPORTA: MAYO

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERACRUZ  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790001

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
 1680 METROS CUADRADOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
 100 %

MONTO AUTORIZADO:	\$1,045,492.05	C/IV
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,045,492.05	C/IV
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO EXISTE	NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	NO EXISTE	NO APLICA X

TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
TIPO DE LICITACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	15/2019301790001/FISM	FECHA:	15/04/2019
CONTRATISTA:	HECTOR MANUEL TAPIA PAREDES		
MONTO CONTRATADO:	\$1,041,837.27		

PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	08/04/2019	REAL
	TERMINO	27/06/2019	30/05/2019
	DÍAS	45	45

ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$312,551.18	16/04/2019
	FECHA DE PAGO:		16/04/2019

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTO:
MONTO AFIANZADO:	\$312,551.18	\$89,813.55	\$104,183.72
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERREPE	FIANZAS MONTERREPE	FIANZAS MONTERREPE
No. de FIANZA:	1902458	1902459	1997940
FECHA:	16/04/2019	16/04/2019	30/05/2019

CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICACIÓN	PLAZO		INICIAL	FINAL

MONTO TOTAL CONVENIO + CONTRATO DE OBRAS	\$1,041,837.27	C/IVA
--	----------------	-------

ARQ. JOSUE ALICANDAR AMICON DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR  
 ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER

**OBRA PÚBLICA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TLACOTEPEC DE MEJIA**  
 2019-2021

ANTECEDENTES:  
 CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO  
 OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE 0045 GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO  
 TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA X  
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X  
 SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO  
 COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD 0.0000000000 PROYECTO ESPECIAL SI NO  
 LATITUD 0.0000000000 CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
ANTICIPO 30%	\$0.00					\$312,551.18
CIÓN 1 ( UNO NI	\$0.00	346	\$221,324.61	#####	\$953.99	\$153,973.24
O 2 (DOS Y/O FI	\$0.00	349	\$820,512.66	#####	\$3,536.69	\$570,822.17
TOTALES	\$0.00			#####	\$4,490.68	\$1,037,346.59

AVANCE	AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPORTE	EXISTE	FECHAS	
		MONTO PAGADO EN EL MES:	30/05/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,037,346.59	30/05/2019	
FINIQUITO:	\$1,041,837.27	30/05/2019	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	30/05/2019	

OBSERVACIONES:

\* En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:  
24/06/2019  
MES QUE SE REPORTA  
MAYO

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: AMATITLA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790016 CLAVE: 30EJN0654Y EN AMATITLA

**ANTECEDENTES:**

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI  X NO

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: RURAL X URBANA

ZONA: CLAVE N/A AGEB:  SI  X NO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:  SI  X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:  SI  X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD 0.0000000000 LATITUD 0.0000000000

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO MUY BAJO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO  
CLAVE 30EJN0654Y EN AMATITLA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
30%

MONTO AUTORIZADO:	\$188,332.77	C/IV
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$189,590.54	C/IV
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	EXISTE	NO APLICA X
LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	AD/2019301790016/FISM	FECHA:	13/05/2019
CONTRATISTA:	ALARREZ Y ASOCIADOS SA DE CV		
MONTO CONTRATADO:	\$0.00		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA		
	INICIO 14/05/2019		REAL 14/05/2019
	TERMINO 12/06/2019		
	DÍAS 30		
APLICA:	X NO APLICA		
MONTO:	\$56,499.83	PORCENTAJE:	30.0
FECHA DE PAGO:	16/05/2019		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTO
MONTO AFIANZADO:	\$56,499.83	\$16,235.58	
AFIANZADORA:	UBB FIANZAS MONTE	UBB FIANZAS MONTE	
No. de FIANZA:	1994258	1994257	
FECHA:	13/05/2019	13/05/2019	
CONVENIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICACION:	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO DE APLICACIÓN (CONVENIO + CONTRATO DE OBRAS):	NO APLICA		

ARQ. JOSUÉ ABERNIZ RINCÓN DIRECTOR DE OBRAS  
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER SUPERVISOR

**AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA**  
2019

FORMATO 11

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*			
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE	
		No.	MONTO
ANTICIPO 30%	\$0.00	IMPORTE OBRA EST.	IMPORTE DEVENGADO
		\$56,499.83	\$56,499.83
		AMORTIZADO	CARGOS ADICIONALES
		\$0.00	\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$56,499.83

REPORTE	EXISTE	FECHAS															
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$56,499.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$56,499.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINQUITO:	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO REAL	
AVANCE PROGRAMADO	0
AVANCE REAL	0
AVANCE ACUMULADO	0
AVANCE ATRASO (%)	0

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	24/06/2019
MES QUE SE REPORTA	MAYO

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	TLACOTEPEC DE MEJIA	DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS POR BUJ	No. DE OBRA:	2019301790202	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
Cuenta con Proyecto Ejecutivo:				CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
TIPO DE ZONA:				CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:					
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:					
LARGITUD:					
LATITUD:					

ANTECEDENTES:			
SI	X	NO	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	MEDIO	Bajo	X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:			
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
Cuenta con Opinión Favorable			
SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:			
LONGITUD:			
LATITUD:			

No. EST.	Monto	ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
		Polizas Cheque	Monto					
01 (UNO) / 01	\$0.00			\$151,091.54	\$0.00	\$651.26	\$0.00	\$150,440.28
TOTALES	\$0.00			\$151,091.54	\$0.00	\$651.26	\$0.00	\$150,440.28

REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE													
Monto pagado en el mes:	\$150,440.28												
Monto pagado acumulado:	\$150,440.28												
Finiquito:	\$151,091.54												
Acta entrega recepción:	X												
FECHAS													

OBSERVACIONES:													
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100%

Monto Autorizado:	\$151,091.54	C/IV		
Monto del Presupuesto Base:	\$152,441.00	C/IV		
Validación del Proyecto:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
Dependencia que valida:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
Dependencia del Proyecto:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
Dependencia que otorga:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
La factibilidad:	EXISTE			
Tipo de Licitación:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

No. de Contrato:	72019301790202/IPBURSATILIZACIK	Fecha:	03/04/2019
Contratista:	ALARHEZ Y ASOCIADOS SA DE CV		
Monto Contratado:	\$0.00	C/IV	
Periodo de Ejecución:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	04/04/2019	03/05/2019	04/04/2019
	DIAS	30	0
	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

Tipo de Fianza:	ANTICIPO	Cumplimiento	Vicios Ocultos
Monto Afianzado:	\$13,025.13	\$15,109.15	\$15,109.15
Afianzadora:	IUBB FIANZAS MONTECUBANAS MONTE		
No. de Fianza:	1991787	1991787	1991787
Fecha:	03/04/2019	03/05/2019	03/05/2019
Convenios:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
Modificatorio:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO	NO APLICA	
Monto Total Contratado (Convenio + Contrato) de Obra:	NO APLICA		

ARQ. EMMANUEL ZAMUDIO SEGOVIA  
SUPERVISOR

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA  
2019-2021

FORMATO II

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Anexo al oficio No. EMO/2019/TLACOTEPEC DE MEJÍA/49204

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019301790001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERACRUZ	Sí	No	Sí	No
2019301790002	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN REYES CLAVE 30EPR0263Z EN	No	No	No	No
2019301790005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 0045	No	No	No	No
2019301790006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 0030	No	No	No	No
2019301790007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZAP 0045	No	No	No	No
2019301790009	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZAP 0064	No	No	No	No
2019301790010	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZAP 0045	No	No	No	No
2019301790012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTLA	No	No	No	No
2019301790013	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AMATITLA	No	No	No	No
2019301790015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACTOPAN	No	No	No	No
2019301790016	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO CLAVE: 30EJN0654Y EN AMATITLA	Sí	No	Sí	No
2019301790017	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 279 "URSULO GALVAN REYES "	No	No	No	No
2019301790018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIXTLA	No	No	No	No



Anexo al oficio No. EMO/2019/TLACOTEPEC DE MEJÍA/49208

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019301790301	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHIXTLA	No	No	No	No

EMO/2019/TLACOTEPEC DE MEJÍA/49208



Anexo al oficio No. EMO/2019/TLACOTEPEC DE MEJÍA/49206

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019301790202	CONSTRUCCIÓN DE OFINAS EN PALACIO MUNICIPAL	Sí	No	Sí	No
2019301790203	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ZONA ESTACIONAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE	No	No	No	No

EMO/2019/TLACOTEPEC DE MEJÍA/49206



# H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA  
No. de obra: 2019301790001.00

Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA  
Periodo: MAYO


Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019

Número de estimación: 2 (DOS Y/O FI

Fuente de financiamiento: MUNICIPAL Y DE L

Fecha de revisión: 25/06/2019


Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERACRUZ

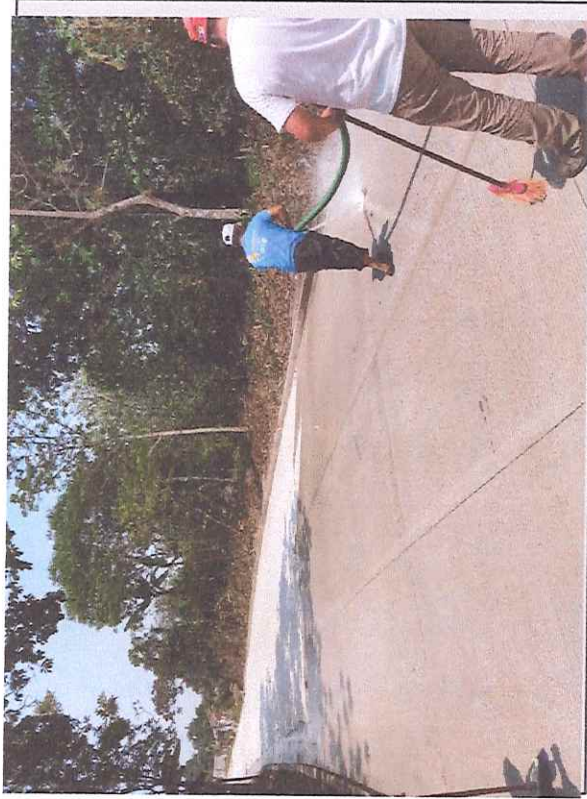

### FOTO

CONCEPTO DE OBRA EJECUTADO: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 15 CM. DE ESPESOR EN ARROYO DE CALLE Y APROCHES, CON RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 CMS., +/- 2.5

CONCEPTO DE OBRA EJECUTADO:

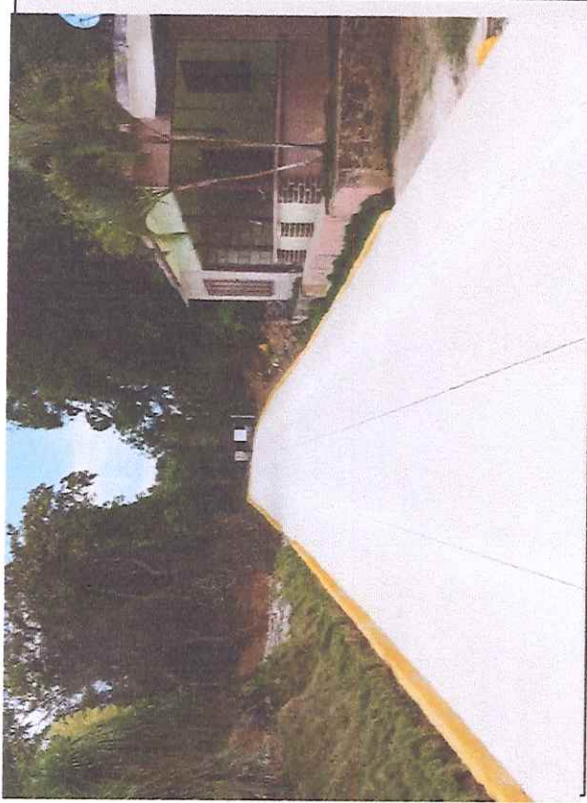

### FOTO

CONCEPTO DE OBRA EJECUTADO: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO DE GUARNICIONES

### Observaciones:

MIGUEL ÁNGEL SERRANO RIVERA  
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal



# H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** TLACOTEPEC DE MEJÍA  
**No. de obra:** 2019301790001.00

**Localidad:** TLACOTEPEC DE MEJÍA  
**Periodo:** MAYO

**Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2019

**Número de estimación:** LICIÓN No. 2 (DOS Y/O F

**Fuente de financiamiento:** CIAL MUNICIPAL Y DE L

**Fecha de revisión:** 25/06/2019

**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VERACRUZ

\_\_\_\_\_

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** TLACOTEPEC DE MEJÍA      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2019  
**No. de obra:** 2019301790016.00      **Número de estimación:** ANTICIPO (30 %)  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO      **Fuente de financiamiento:** CIAL MUNICIPAL Y DE L  
 CLAVE: 30EJN0654Y EN AMATITLA      **Fecha de revisión:** 25/06/2019

**Localidad:** AMATITLA  
**Periodo:** MAYO



**FOTO**

**Concepto de obra ejecutado:** Dala de desplante, sección 12x20 cm, concreto f'c=200 kg/cm<sup>2</sup>, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex de 15x20-4, cimbrado común, incluye: cimbra, descimbra y acarreo de los materiales a una 1a. Estación a 20.00 m. de

**Concepto de obra ejecutado:**

**FOTO**  
 Fabricación de muro de block macizo, de 12x20x40, junteado con mortero cem-arena 1:5. En juntas de hasta 2.5 cm. Con acabado común. Incluye :cimbra común y todo lo necesario para su correcta ejecución .(p.u.o.t.).

### Observaciones:

MIGUEL ÁNGEL SERRANO RIVERA  
 INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	TLACOTEPEC DE MEJÍA	<b>Localidad:</b>	AMATITLA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2019
<b>No. de obra:</b>	2019301790016.00	<b>Periodo:</b>	MAYO	<b>Número de estimación:</b>	ANTICIPO (30 %)
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO				
	CLAVE: 30EJN0654Y EN AMATITLA				

<b>Fuente de financiamiento:</b>	MUNICIPAL Y DE L
<b>Fecha de revisión:</b>	25/06/2019

c.c.p. Director de Obras Públicas  
c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** TLACOTEPEC DE MEJÍA      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2019  
**No. de obra:** 2019301790202.00      **Localidad:** TLACOTEPEC DE MEJÍA      **Ejercicio de estimación:** UNO No. 1 (UNO Y/O F)  
**Periodo:** MAYO      **Fuente de financiamiento:** PROPIOS POR BURSA  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL      **Fecha de revisión:** 25/06/2019



#### FOTO

**Concepto de obra ejecutado:** Losa plana en super estructura de 10 cm. De peralte, fabricada con concreto  $f_c=200\text{kg/cm}^2$ , r.n. agreg. max 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra, acabado común, descimbra, suministro y colocación de malla electro

**Concepto de obra ejecutado:**



#### FOTO

Limpieza final de la obra con detergente de polvo , agua y ácido muriático diluido, hasta una altura máxima de 3.00 m. incluye : acarreo los materiales hasta una 1 a. estación a 20 m. de distancia horizontal.

#### Observaciones:

EMMANUEL ZAMUDIO SEGOVIA  
ARQUITECTO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA

Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019

No. de obra: 2019301790202.00

Periodo: MAYO

Número de estimación: CIÓN No. 1 (UNO Y/O F)

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

Fuente de financiamiento: OS PROPIOS POR BURSA

Fecha de revisión: 25/06/2019

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis
