



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA **LOCALIDAD:** TLACOTEPEC DE MEJIA **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 0045
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES **No. DE OBRA:** 2019301790005 **DATOS GENERALES**

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE 0045 **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
ZONA: URBANA X **AGEB:** SI X NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
LATITUD: 19.188245° **LONGITUD:** -96.833635°

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO					
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO PAGADO EN EL MES:	REPORTES	
	EXISTE	FECHAS
\$0.00		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA
 2018-2021

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: 17 OBRAS CUARTO DORMITORIO
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: REPRESENTA UN AVANCE DE 7% EJECUTANDO CONCEPTOS COMO LIMPIEZ, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES. EXCAVACION A MANO EN CERAS MATERIAL TIPO "B" PARA CIMENTACION. PLANTILLA DE CONCRETO F=C= 100KG/CM2 Y CIMENTOS DE MAMPPOSTERIA DE PIEDR BRASA.

MONTO AUTORIZADO: \$1,071,000.00 **C/IV**
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,071,000.00 **C/IV**
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE **NO APLICA** X
DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE **NO APLICA** X
DEPENDENCIA DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE **NO APLICA** X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD: EXISTE NO EXISTE **NO APLICA** X

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
NO. DE CONTRATO: LS/2019301790005/FISM **FECHA:** 23/09/2019
CONTRATISTA: MAWSE CONSTRUCCIONES DE OBRAS S.A. DE C.V. **C/IV**
MONTO CONTRATADO: \$1,070,754.59 **REAL**
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 24/09/2019 **TERMINO** 24/09/2019
FECHA: 22/11/2019
DIAS: 60 **0**

ANTICIPO: APLICA X NO APLICA
MONTO: \$321,226.38 **PORCENTAJE:** 30.0
FECHA DE PAGO:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTO
MONTO FIANZA:	\$321,226.38	\$92,306.00	
AFIANZADORA:	ENTY FINANZAS, S.A. DE ENTY FINANZAS, S.A. DE C.V.		
NO. DE FIANZA:	2092625-0000	2092625-0000	
FECHA:	23/09/2019	23/09/2019	

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO NO APLICA
PLAZO: INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO): \$1,070,754.59 **C/IVA**

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS **ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER** SUPERVISOR
 FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA,
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790006
DATOS GENERALES		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 0030	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DI:	CLAVE	0030		
ZONA:	URBANA	X	AGEB:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	NO	
LATITUD	COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	-96.843402°	
ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
		MUY ALTO	ALTO	MEDIO
		ALTO	BAJO	MUY BAJO
		TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:		
		DIRECTA	X	INDIRECTA
		COMPLEMENTARIA		
		PROYECTO ESPECIAL		
		CUENTA CON OPINION FAVORABLE		
		SI	NO	X

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		ESTADO FINANCIERO DE OBRA*					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	Cargos Adicionales	IMPORTE DEVENGADO
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	REPORTE EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00		
FINQUITO:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

12 CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

SE HA LIMPIADO Y TRAZADO EL AREA, SE HAN TERMINADO LOS TRABAJOS DE PLANTILLA DE CONCRETO Y CIMENTACION DEL CUARTO DORMITORIO, ASU VEZ TERMINARON DE DESPLANTAR LA CADENA DE DESPLANTE, MURO DE BLOCK Y CASTILLOS EN LOS 12 DORMITORIOS

MONTO AUTORIZADO: \$756,000.00

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$756,000.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA: NO EXISTE

LA FACTIBILIDAD: NO APLICA

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA

EXISTE

NO. DE CONTRATO: LS/2019301790006/FISM

CONTRATISTA: GRUPO AVEIMA, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$755,794.75

PERIODO DE EJECUCION:

INICIO	02/09/2019	REAL
TERMINO	31/10/2019	C/VA
DIAS	60	

ANTICIPO: APLICA MONTO: NO APLICA PORCENTAJE: X

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO

MONTO AFIANZADO: \$75,579.47

AFIANZADORA: SOFINEX

No. DE FIANZA: 2361553

FECHA: 30/08/2019

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO EXISTE IMPORTE/PERIODO

MONTO TOTAL CONTRATADO: \$755,794.75

CONTRATO: NO APLICA

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA,
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790007
DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZAP 0045			

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	0045	
ZONA:	URBANA	AGEB:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	X	SI	X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	0.000000000	
LATITUD	0.000000000	PROYECTO ESPECIAL	SI
ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
		MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO	
		TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
		DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA	
		CUENTA CON OPINION FAVORABLE	
		SI NO X	

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	S MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEREGADO
		No.	MONTO						
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINIQUITO:	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

OPRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA

2018-2021

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

SE HAN EJECUTADO TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION DEL AREA DONDE SE CONSTRUYO LOS CIMIENTOS DEL CUARTO, SE ANCLARON LOS CASTILLOS, SE CONSTRUYO DALA DE DESPLANTE, MURO DE BLOCK Y CASTILLOS

MONTO AUTORIZADO: \$535,500.00

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$535,500.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA: NO EXISTE

LA FACTIBILIDAD: NO APLICA

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A MENOS 3 PERSONAS: X

licitacion publica

NO. DE CONTRATO: LS/2019301790007/FISM

CONTRATISTA: GRUPO AVEIMA, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$534,842.59

PERIODO DE EJECUCION:

INICIO	10/09/2019	REAL
TERMINO	08/11/2019	C/IV
DIAS	60	

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO

MONTO AFIANZADO: \$53,484.26

AFIANZADORA: SORINEX

No. DE FIANZA: 2361563

FECHA: 09/09/2019

CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO CONVENIO + CONTRATO DE OBRAS: \$534,842.59

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
 EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE AFORRACIONES No. DE OBRA: 2019301790009 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZAP 0064

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
 TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DI: CLAVE 0064 GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
 ZONA: URBANA X AGEB: SI X NO TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
 SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO
 LATTITUD: COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD 0.0000000000 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI NO X

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	FACTURAS					IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTTO			AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	TOTAL		
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REPORTE

MONTTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$0.00	FECHAS
MONTTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

OBRRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
2018-2021

En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (METAL) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

LLEVAN ELABORADOS EN LOS 5 BAÑOS, TRAZO Y LIMPIEZA, EXCAVACION, CIMENTACION, TRABAJOS DE CADENA DE DESPLANTE, MURO DE BLOCK Y CADENA DE CERRAMIENTO CON CASTILLOS.

MONTO AUTORIZADO: \$223,125.00 C/VA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$223,125.00 C/VA
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA EXISTE X

NO. DE CONTRATO: AD/2019301790009/FISM FECHA: 11/09/2019
CONTRATISTA: GRUPO AVEIMA, S.A. DE C.V. \$222,851.08
MONTO CONTRATADO: PROGRAMADA REAL C/VA
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 12/09/2019 TERMINO 12/09/2019
 DIAS 26/10/2019
ANTICPO: MONTO: 45 APLICA NO APLICA PORCENTAJE: 0

TIPO DE FINANZA: ANTICPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFANZADO: \$22,285.11
AFIANZADORA: SOFIMEX
No. DE FINANZA: 2361555
FECHA: 11/09/2019

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
 NO APLICA INICIAL FINAL C/VA

MONTO TOTAL CONTRATADO CONVENIO: \$222,851.08 C/VA

ING. JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
 ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA **LOCALIDAD:** TLACOTEPEC DE MEJIA **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZAP 0045
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES **No. DE OBRA:** 2019301790010

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO **ANTECEDENTES:** **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE 0045 **TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:** DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA
ZONA: URBANA AGEB: SI NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.192317° **LONGITUD** -96.846768° **PROYECTO ESPECIAL** CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	FACTURAS			IMPORTE DERIVADO
		No.	MONTO			AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
1 NORMAL	\$210,892.65	908310	\$244,635.47	897	\$244,635.47	\$0.00	\$1,054.46	\$0.00	\$243,581.01
TOTALES	\$210,892.65		\$244,635.47		\$244,635.47	\$0.00	\$1,054.46	\$0.00	\$243,581.01

REPORTE	EXISTE	FECHAS	AVANCE FISICO REAL													
			AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$243,581.01	27/08/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$243,581.01	27/08/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINIQUITO:	\$502,446.74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
 15 OBRAS O 631.47 M2 DE LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 Y 10 CM. DE ESPESOR
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
 TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO: \$506,641.41 **C/N/**
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$506,641.41 **C/N/**
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE **NO APLICA**
DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE **NO APLICA**
DEPENDENCIA DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE **NO APLICA**
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE NO EXISTE **NO APLICA**

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: 15/2019301790010/FISM **FECHA:** 31/07/2019
CONTRATISTA: EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICOM S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATADO: \$502,446.74 **REAL** C/N/
PROGRAMADA

PERIODO DE EJECUCIÓN:
INICIO: 01/08/2019 **01/08/2019**
TERMINO: 30/09/2019 **30/09/2019**
DIAS: 61 **61**

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO **CUMPLIMIENTO** **VICIOS OCULTO:**
MONTO FIANZA: \$43,314.37 **\$50,259.07**
AFIANZADORA: UBB FINANZAS MONTEHERRERA **UBB FINANZAS MONTEHERRERA**
NO. DE FIANZA: 2017956 **2028301**
FECHA: 31/07/2019 **30/09/2019**

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO CONVENIO + CONTRATO: \$502,446.74 **C/VA**

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA
 2018-2021

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
 SUPERVISOR

ING. JOSE OLIVARES TAMAYO
 DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar esta hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: CHIXTLA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTLA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790012

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

ANTECEDENTES:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A

ZONA: URBANA X

AGEB: SI X NO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA

COMPLEMENTARIA

PROYECTO ESPECIAL

CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

LATITUD: 19.180387° LONGITUD: -96.852683°

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO						
MACCION 2 FINIQ	\$27,885.45	909300	\$251,295.39	446	\$251,295.39	\$75,388.62	\$1,083.17	\$0.00	\$174,823.60
MACCION 1 NOR	\$216,633.96	908310	\$251,295.39	435	\$251,295.39	\$75,388.62	\$1,083.17	\$0.00	\$174,823.60
TOTALES	\$244,499.41		\$502,590.78		\$502,590.78	\$150,777.24	\$2,166.34	\$0.00	\$349,647.20

MONTO PAGADO EN EL MES:	REPORTES		FECHAS
	EXISTE	NO EXISTE	
\$174,823.60			23/09/2019
\$500,424.44			30/09/2019
\$502,590.78			23/09/2019

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	6.56	43.52	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	6.56	43.52	100	0	0	
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	6.56	43.52	100	0	0	
ATRISO (%)	0	0	0	0	0	0	24.12	20.80	40	0	0	

OBSERVACIONES:



OBRAS PUBLICAS

**H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021**

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORITA
SEPTIEMBRE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

8 CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

terminada y operando

MONTO AUTORIZADO: \$502,590.79 C/1/
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$504,000.00 C/1/
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
LA FACIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: LS/2019301790012/FISM FECHA: 22/07/2019
CONTRATISTA: IC&A CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATADO: \$502,590.79 REAL C/1/
PROGRAMADA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 23/07/2019 23/07/2019
TÉRMINO 20/09/2019 20/09/2019
DÍAS 60 60

ANTICIPO: APLICA X NO APLICA PORCENTAJE: 30%
MONTO: \$150,777.24
FECHA DE PAGO: 30/07/2019

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCURTO
MONTO AFIANZADO:	\$150,777.24	\$43,326.79	\$50,259.08
AFIANZADORA:	SOFINEX	SOFINEX	SOFINEX
No. DE FINANZA:	2337378	2337386	2337395
FECHA:	22/07/2019	22/07/2019	20/09/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
NO APLICA	PLAZO	INICIAL	FINAL
NO APLICA	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO + CONTRATADO:	\$502,590.79		C/VA

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVER SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
 30/09/2019
 MES QUE SE REPORTA
 SEPTIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	AMATITLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790013
DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AMATITLA	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DI:	CLAVE	GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
ZONA:	RURAL	MUY ALTO	ALTO	MEDIO
AGEB:	URBANA	ALTO	MEDIO	Bajo
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
LATITUD	19.183239°	DIRECTA	X	INDIRECTA
LONGITUD	-96.825193°	PROYECTO ESPECIAL		COMPLEMENTARIA
		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		
		SI		NO
				X

No. EST.	MONTTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMONTIZADO	S MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO	ESTADO FINANCIERO DE OBRA*											
		No.	MONTTO							FACTURAS	AVANCE FISICO REAL										
1 NORMAL	\$0.00	909300	\$278,796.72	441	\$278,796.72	\$0.00	\$1,201.71	\$0.00	\$277,595.01												
TOTALES	\$0.00		\$278,796.72		\$278,796.72	\$0.00	\$1,201.71	\$0.00	\$277,595.01												

REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE													
MONTTO PAGADO EN EL MES:	\$277,595.01												
MONTTO PAGADO ACUMULADO:	\$277,595.01												
FECHAS	10/09/2019												
FINQUITO:	\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:													

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	17.12	49.44	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	20	5	30	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	20	5	30	0	0	0
ATRASSO (%)	0	0	0	0	0	0	-20	-10	-30	0	0	0

OBSERVACIONES:

En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



OPBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA
 2018-2021

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (METRA) DE LA OBRA:	8 cuartos dormitorios
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	TERMINADA Y OPERANDO

MONTTO AUTORIZADO:	\$504,000.00	C/N/A
MONTTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$504,000.00	C/N/A
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:	EXISTE	NO EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	

NO. DE CONTRATO:	ES/2019301790013/FISM	FECHA:	23/07/2019
CONTRATISTA:	IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		
MONTTO CONTRATADO:	\$501,639.59		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	24/07/2019	24/07/2019
	TERMINO	21/09/2019	21/09/2019
	DIAS	60	60
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTTO:		
	FECHA DE PAGO:		
	PORCENTAJE:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIGOS OCULTO:
MONTTO AFIANZADO:	\$43,244.79	\$50,163.96	
AFIANZADOR:	SOFINEX	SOFINEX	
No. DE FIANZA:	2350140	2350152	
FECHA:	24/07/2019	21/09/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTTO TOTAL CONTRATADO CONVENIO + CONTRATO DE OBRAS:	\$501,639.59		C/NA

ING. JESÚS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
 ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR
 FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	ACTOPAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790015
DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACTOPAN	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	N/A	
ZONA:	RURAL	URBANA	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:	SI	NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	-96.860444°	
LATITUD	19.192715°		
ANTECEDENTES:			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO			
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:			
DIRECTA X INDIRECTA			
PROYECTO ESPECIAL CUESTA CON OPINION FAVORABLE			
SI NO X			

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTO						
1 NORMAL	\$241,365.84	909300	\$279,984.37	2027	\$279,984.37	\$0.00	\$1,206.83	\$0.00	\$278,777.54
TOTALES	\$241,365.84		\$279,984.37		\$279,984.37	\$0.00	\$1,206.83	\$0.00	\$278,777.54

MONTO PAGADO EN EL MES:	REPORTE		FECHAS
	EXISTE	NO EXISTE	
	\$278,777.54		06/09/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$278,777.54		30/09/2019
FINQUITO:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	8.94	42.88	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	10	40	50	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	10	50	100	0	0	0
ATRASSO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	8 CUARTOS DORMITORIO
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO:	\$504,000.00	C/VA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$504,000.00	C/VA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO APLICA X
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	15/2019301790015/FISM	FECHA:	26/07/2019
CONTRATISTA:	EDIFICACIONES ACAT S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$503,742.62		
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 27/07/2019 TERMINO 24/09/2019	REAL 27/07/2019 C/VA 24/09/2019	
ANTICIPO:	APLICA 60 MONTO: NO APLICA X PORCENTAJE: 60		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$43,426.09	\$50,374.26	
AFIANZADORA:	SOHNWEX	SOHNWEX	
No. DE FIANZA:	2350140	2350536	
FECHA:	26/07/2019	24/09/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	EXISTE INICIAL FINAL	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) INCLUIDA:	\$503,742.62		C/VA

ING. JOSHELINDS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	AMATITLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE AFORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790016
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO	
CLAVE:		30E1N0654Y EN AMATITLA	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	NO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
ZONA:	RURAL	X	URBANA	AGEB:
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	NO	X

LATITUD	19.183678°	LONGITUD	-96.826587°
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL	
COMENTARIOS:		CUESTA CON OPINION FAVORABLE	
ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		COMPLEMENTARIA	

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	No.	No.	FACTURAS			IMPORTE DEPENDIENDO
		No.	MONTO				IMPORTE OBRA EST.	AMONTIZADO	5 MILLAR	
ADOS DOS FINI	\$27,084.68	909300	\$27,084.68	A895			\$0.00	\$116.74	\$0.00	\$26,967.34
ACION UNO NO	\$169,499.49	907310	\$169,499.49	A877			\$56,499.23	\$730.60	\$0.00	\$112,269.66
TOTALES	\$196,584.17		\$196,584.17				\$56,499.23	\$847.34	\$0.00	\$139,237.00

REPORTE		EXISTE		FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$26,967.34	06/09/2019			
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$139,237.00	31/07/2019			
FINIQUITO:	\$196,584.17	06/09/2019			
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	12/06/2019			

OBSERVACIONES:	AVANCE FISICO REAL												
	AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021



DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO
CLAVE:	30E1N0654Y EN AMATITLA
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	TERMINADA Y OPERANDO
MONTO AUTORIZADO:	\$196,584.17
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$189,590.54
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	NO EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE
LICTACION PUBLICA	X

NO. DE CONTRATO:	AD/2019301790016/FISM	FECHA:	13/05/2019
CONTRATISTA:	ALARHEZ Y ASOCIADOS SA DE CV		
MONTO CONTRATADO:	\$188,332.77		
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA		REAL
INICIO:	14/05/2019		14/05/2019
TERMINO:	12/06/2019		12/06/2019
DIAS:	30		30
APLICA:	X	NO APLICA	
MONTO:	\$56,499.83	PORCENTAJE:	30.1
FECHA DE PAGO:	16/05/2019		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$56,499.83	\$16,235.58	\$19,654.00
AFIANZADORA:	UBB FIANZAS MONTERRUBIO	UBB FIANZAS MONTERRUBIO	UBB FIANZAS MONTERRUBIO
No. DE FIANZA:	1994258	1994257	2011673
FECHA:	13/05/2019	13/05/2019	12/06/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
PLAZO	X	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) EN OBRA	\$196,584.16		C/VA

ING. JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA LOCALIDAD: TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019301790017 DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 279 "URSULO GALVAN REYES"

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO X ANTECEDENTES: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1 BARDA PERIMETRAL

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE 0030
ZONA: URBANA X AGE: SI X NO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO X
LATITUD COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: -96.842345° LONGITUD: PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: TERMINADA Y OPERANDO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO			5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
UNO FINIQUITO	\$30,984.75	909300	\$35,942.31	A896	\$35,942.31	\$154.92	\$0.00	\$35,787.39
TOTALES	\$30,984.75		\$35,942.31		\$35,942.31	\$0.00	\$154.92	\$0.00

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

MONTO PAGADO EN EL MES:	REPORTE		FECHAS	AVANCE FISICO REAL											
	EXISTE			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$35,787.39			06/09/2019	0	0	0	0	0	0	0	92.95	100	0	0	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$35,787.39		30/09/2019	0	0	0	0	0	0	0	92.95	100	0	0	0
FINIQUITO:	\$35,787.39		06/09/2019	0	0	0	0	0	0	0	92.95	100	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X		03/09/2019	0	0	0	0	0	0	0	92.95	100	0	0	0

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO REAL	0	0	0	0	0	0	0	92.95	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	92.95	100	0	0	0
ATRASSO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

En caso de requerir más filias en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIGOS OCULTOS
MONTO AFANZADO:	\$3,098.48	\$3,594.23	
AFANZADORA:	SOFINEX	SOFINEX	
No. DE FINANZA:	1053154	1053185	
FECHA:	14/08/2019	03/09/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO GOBIERNO + CONTRATO OBRAS:	NO APLICA	\$35,942.31	C/VA

NO. DE CONTRATO:	AD/2019301790017/FISM	FECHA:	14/08/2019
CONTRATISTA:	ALARHEZ Y ASOCIADOS SA DE CV		
MONTO CONTRATADO:	\$35,942.31		
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA		
	INICIO 15/08/2019	REAL 15/08/2019	
	TERMINO 03/09/2019		
	DIAS 20		
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	NO APLICA
	FECHA DE PAGO:		
	PORCENTAJE:	X	

MONTO AUTORIZADO:	\$36,000.00	C/VA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$36,000.00	C/VA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO APLICA

TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitacion publica	

NO. DE CONTRATO:	AD/2019301790017/FISM	FECHA:	14/08/2019
CONTRATISTA:	ALARHEZ Y ASOCIADOS SA DE CV		
MONTO CONTRATADO:	\$35,942.31		
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA		
	INICIO 15/08/2019	REAL 15/08/2019	
	TERMINO 03/09/2019		
	DIAS 20		
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	NO APLICA
	FECHA DE PAGO:		
	PORCENTAJE:	X	

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTEA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD: CHIXTIA	DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIXTIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2019301790018	DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	ANTECEDENTES:
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DI:	CLAVE N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	AGEB: SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>
LATITUD 19.16/892°	LONGITUD -96.829369°	PROYECTO ESPECIAL <input type="checkbox"/>
		CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DERIVADO
		No.	MONTO						
MACION 1 NOR	\$0.00	908310	\$266,162.58	A-655	\$266,162.58	\$79,848.77	\$1,147.25	\$0.00	\$185,166.55
TOTALES	\$0.00		\$266,162.58		\$266,162.58	\$79,848.77	\$1,147.25	\$0.00	\$185,166.55

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
\$425,860.19		15/08/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	EXISTE	FECHAS
\$425,860.19		31/08/2019
FINQUITO:	EXISTE	FECHAS
\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	132	6948	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	5	70	23	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	5	75	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0.38	5.52	0	0	0	0



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	12 CUARTOS PARA BAÑOS
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO:	\$532,325.16	C/IV
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$535,500.00	C/IV
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:	EXISTE	NO APLICA X
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitacion publica	

NO. DE CONTRATO:	15/2019301790018/FISM	FECHA:	25/07/2019
CONTRATISTA:	LOGISTICA ROKMAG, S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$532,325.16		
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA		
	INICIO	26/07/2019	26/07/2019
	TERMINO	23/09/2019	23/09/2019
	DIAS	60	60
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$159,697.55	PORCENTAJE: 30.0
	FECHA DE PAGO:	07/08/2019	

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$159,697.55	\$45,890.10	\$53,232.52
AFIANZADORA:	SOFINEX	SOFINEX	SOFINEX
No. DE FINANZA:	2340672	2340685	2365198
FECHA:	25/07/2019	25/07/2019	23/09/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INGICAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) (EN OBRAS)	NO APLICA		
			\$532,325.16
			C/IVA

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

FORMATO 11

En caso de requerir más fljas en el apartado de estado financiero utilizar otra flja.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	CHIXTIA	DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790018	DESCRIPCION DE LA OBRA:
				CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIXTIA

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

ANTECEDENTES:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A
 ZONA: RURAL URBANA
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
 SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
 LATITUD: 19.167892° LONGITUD: -96.829369°

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
 TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA
 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI NO X

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTO						
MACION 1 NOR	\$0.00	908310	\$266,162.58	A-655	\$266,162.58	#####	\$1,147.25	\$0.00	\$185,166.55
TOTALES	\$0.00		\$266,162.58		\$266,162.58	#####	\$1,147.25	\$0.00	\$185,166.55

MONTOS	REPORTES		FECHAS
	EXISTE	NO EXISTE	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$425,860.19		15/08/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$425,860.19		31/08/2019
FINIQUITO:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	132	6948	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	5	70	25	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	5	77	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	-3.5	10.5	100	0	0	0	0



OBRA PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	12 CUARTOS PARA BAÑOS
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO:	\$532,325.16	C/VA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$535,500.00	C/VA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	15/2019301790018/FISM	FECHA:	25/07/2019
CONTRATISTA:	LOGISTICA ROKMAG, S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$532,325.16		
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO: 26/07/2019 TERMINO: 23/09/2019	REAL: 26/07/2019 C/VA: 23/09/2019	
ANTICIPO:	MONTO: \$159,697.55 APLICA: X NO APLICA: NO APLICA	FECHA DE PAGO: 07/08/2019	PORCENTAJE: 30.0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIGOS OCULTO
MONTO AFIANZADO:	\$159,697.55	\$45,890.10	\$33,232.52
AFIANZADORA:	SONIMEX	SONIMEX	SONIMEX
No. DE FIANZA:	2340672	2340685	2365198
FECHA:	25/07/2019	25/07/2019	23/09/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO: NO APLICA PLAZO: NO APLICA	INICIAL: INICIAL FINAL: FINAL	FECHA: C/VA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) (EN OBRA)	\$532,325.16		C/VA

ING. JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO DIRECTOR DE OBRAS
 ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA SUPERVISOR

FORMATO 11

En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO:	TLACOTEPEC DE MEJIA	LOCALIDAD:	TLACOTEPEC DE MEJIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019301790112
DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PALACIO MUNICIPAL		1 TECHADO	

CIENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		CLAVE	N/A		
ZONA:	RURAL	AGEB:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		SI	NO	X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL	DIRECTA	INDIRECTA	CONTRIBUTARIA
LATITUD	19.188630°	LONGITUD	-96.838366°	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	
ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
		MUY BAJO			
		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
		DIRECTA			
		INDIRECTA			
		CONTRIBUTARIA			
		SI			
		NO			

No. EST.	MONTTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTTO						
MACION 2 NOR	\$0.00	909300	\$150,927.60	442	\$150,927.60	\$0.00	\$650.55	\$0.00	\$150,277.05
MACION 1 NOR	\$0.00	190831	\$150,927.60	433	\$150,927.60	\$0.00	\$650.55	\$0.00	\$150,277.05
TOTALES	\$0.00		\$301,855.20		\$301,855.20	\$0.00	\$1,301.10	\$0.00	\$300,554.10

REPORTES		EXISTE		FECHAS	
MONTTO PAGADO EN EL MES:	\$150,277.05			11/09/2019	
MONTTO PAGADO ACUMULADO:	\$300,554.10			11/09/2019	
FINIQUITO:	\$0.00				
ACTA ENTREGA RECEPCION:	\$0.00				

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	721	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	18	82	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	18	100	0	0	0	0
ATRASSO (%)	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:



En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRA PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PALACIO MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	TERMINADA Y OPERANDO

MONTTO AUTORIZADO:	\$400,000.00	C/M
MONTTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$400,000.00	C/M
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:	NO EXISTE	NO APLICA
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitacion publica	

NO. DE CONTRATO:	15/2019301790112/FORTAMUNDF	FECHA:	22/07/2019
CONTRATISTA:	IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		
MONTTO CONTRATADO:	\$397,836.33		
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	23/07/2019	23/07/2019
	TERMINO	31/08/2019	31/08/2019
	DIAS	40	40
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTTO:		
	FECHA DE PAGO:		
	PORCENTAJE:		

TIPO DE PLANZA:	ANTICHO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTO:
MONTTO AFANZADO:	\$34,296.24	\$39,783.60	
AFANZADORA:	SOFINEX	SOFINEX	
No. DE PLANZA:	2338758	2339895	
FECHA:	22/07/2019	31/08/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	NO APLICA	
	NO APLICA		
MONTTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO)	\$397,836.33	C/M/A	

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. EMANUELA ZAMUDIO SEGOWI
SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA **LOCALIDAD:** TLACOTEPEC DE MEJIA **DATOS GENERALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS POR BU No. DE OBRA: 2019301790202 **DESCRIPCION DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
ZONA: URBANA **AGEB:** SI X NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
LATITUD: COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.838366° **PROYECTO ESPECIAL:** DIRECTA INDIRECTA CONRIEMENTARIA
CUENTA CON OPINION FAVORABLE: SI NO X

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTTO						
01 UNO V/O	\$0.00	905310	\$151,091.54	A/799	\$151,091.54	\$0.00	\$651.26	\$0.00	\$150,440.28
TOTALES	\$0.00		\$151,091.54		\$151,091.54	\$0.00	\$651.26	\$0.00	\$150,440.28

REPORTES

MONTTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE		FECHAS
	\$150,440.28		
MONTTO PAGADO ACUMULADO:	\$150,440.28		
FINQUITO:	\$151,091.54		
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: TERMINADA Y OPERANDO

MONTTO AUTORIZADO: \$152,441.01
MONTTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$152,441.00
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

NO. DE CONTRATO: 2019301790202/PRBURSATILIZACI
CONTRATISTA: ALARHEZ Y ASOCIADOS SA DE CV
MONTTO CONTRATADO: \$151,091.54
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 04/04/2019 REAL 04/04/2019
 TERMINO 03/05/2019
ANTICIPO: APLICA MONTTO: 30 NO APLICA PORCENTAJE: X

TIPO DE FINANZA: ANTI-CO
MONTTO AFIANZADO: \$13,075.13
AFIANZADORA: UBB FINANZAS MONTE UBB FINANZAS MONTE
NO. DE FINANZA: 1991787
FECHA: 03/04/2019
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO INICIAL FINAL
MONTTO TOTAL ADQUIRIDO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS: \$151,091.54
ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
 DIRECTOR DE OBRAS
ARQ. ENRIQUE ZAMUDIO SIGOMI
 SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2019**

FECHA DE ELABORACION:
30/09/2019
MES QUE SE REPORTEA
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO: TLACOTEPEC DE MEJIA **LOCALIDAD:** CHIHTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES **No. DE OBRA:** 2019301790301
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHIHTLA

DATOS GENERALES
DESCRIPCION DE LA OBRA: 8.620 M2
ANTECEDENTES: GRADO DE REZAGO SOCIAL: ALTO
 TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: INDIRECTA
 PROYECTO ESPECIAL: SI

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A
 ZONA: RURAL AGEB: SI NO X
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X
 SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
 LATITUD: 19.183280° LONGITUD: -96.857073°
 PROYECTO ESPECIAL: SI NO X

No. EST.	MONTTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTTO						
MACION I FINIQ	\$0.00	907310	\$712,852.97	552	\$712,852.97	\$0.00	\$3,072.64	\$0.00	\$709,780.33
TOTALES	\$0.00		\$712,852.97		\$712,852.97	\$0.00	\$3,072.64	\$0.00	\$709,780.33

MONTTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE		FECHAS
	EXISTE	FECHAS	
\$709,780.33			04/07/2019
\$709,780.33			30/08/2019
\$712,852.97	X		04/07/2019
			02/07/2019

OBSERVACIONES:	AVANCE FISICO REAL												
	AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASSO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRA PUBLICA
H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA
 2018-2021

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
 8.620 M2
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
 TERMINADA Y OPERANDO

MONTTO AUTORIZADO: \$717,752.57
MONTTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$717,752.57
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: NO EXISTE
TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA
EXISTE

NO. DE CONTRATO: 9301790301/PARTICIPACIONES FEDER
CONTRATISTA: OLIVO FUENTES DULCE MARIA
MONTTO CONTRATADO: \$712,852.97
PERIODO DE EJECUCION:
 INICIO: 03/06/2019 REAL
 TERMINO: 02/07/2019
 DIAS: 30
ANTICIPO: MONTO: NO APLICA PORCENTAJE: X

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO
MONTTO AFIANZADO: \$61,452.84
AFIANZADORA: SOHNIEK
No. DE FIANZA: 2329283
FECHA: 31/05/2019
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO: NO APLICA
 PLAZO: INICIAL FINAL
MONTTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) G.D.P.H.: \$712,852.97
ING. JOSE OLIVARES TAMAYO
 DIRECTOR DE OBRAS
ARC. EMMA NIEZ ZAMUDIO SEGUN
 SUPERVISOR




H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA **Localidad:** CHIXTLA
No. de obra: 2019301790301 **Periodo:** SEPTIEMBRE
Descripción: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHIXTLA

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
Número de estimación: N/A
Fuente de financiamiento: PARTICIPACIONES FEDERALE
Fecha de revisión: 30/09/2019

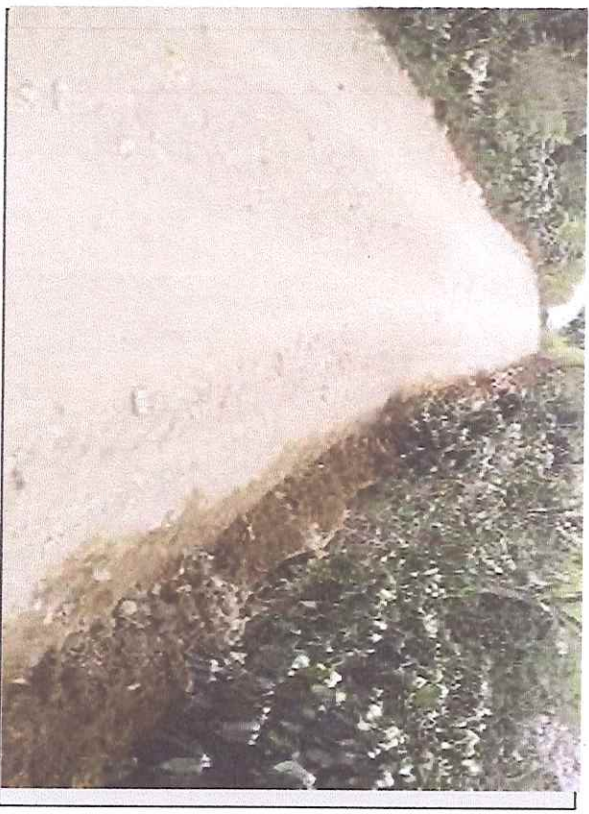

FOTO

TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:

Servicios:



OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
EMMANUEL ZAMUDIO SERRANO DE MEJIA

ARQUITECTO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Ofis



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

[FORMATO 09]

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA **Localidad:** TLACOTEPEC DE MEJÍA **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019301790202 **Período:** SEPTIEMBRE **Número de estimación:** N/A
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL **Fuente de financiamiento:** JS PROPIOS POR BURSATIL
Fecha de revisión: 30/09/2019



Concepto de obra ejecutado:

FOTO
TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO
TERMINADA Y OPERANDO

Observaciones:



OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 EMMANUEL ZAMUDIO SEGONZA
 ARQUITECTO
 2018-2021

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Ofiis



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.
 REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)**

FORMATO 09

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA **Localidad:** TLACOTEPEC DE MEJÍA **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019301790112 **Periodo:** SEPTIEMBRE **Número de estimación:** N/A
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PALACIO MUNICIPAL **Fuente de financiamiento:** LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
Fecha de revisión: 30/09/2019



Concepto de obra ejecutado:

FOTO
 TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO
 TERMINADA Y OPERANDO

Observaciones:



OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 EMMANUEL ZAMUDIO SEGURA DE MEJIA
 2019-2021
 ARQUITECTO

- c.c.p. Presidente Municipal
 - c.c.p. Contralor Interno
 - c.c.p. Tesorero Municipal
 - c.c.p. Director de Obras Públicas
 - c.c.p. Ofiis
- Supervisor responsable



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

[FORMATO 09]

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA
No. de obra: 2019301790018
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIXTLA

Localidad: CHIXTLA
Periodo: SEPTIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
Número de estimación: N/A


Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 30/09/2019

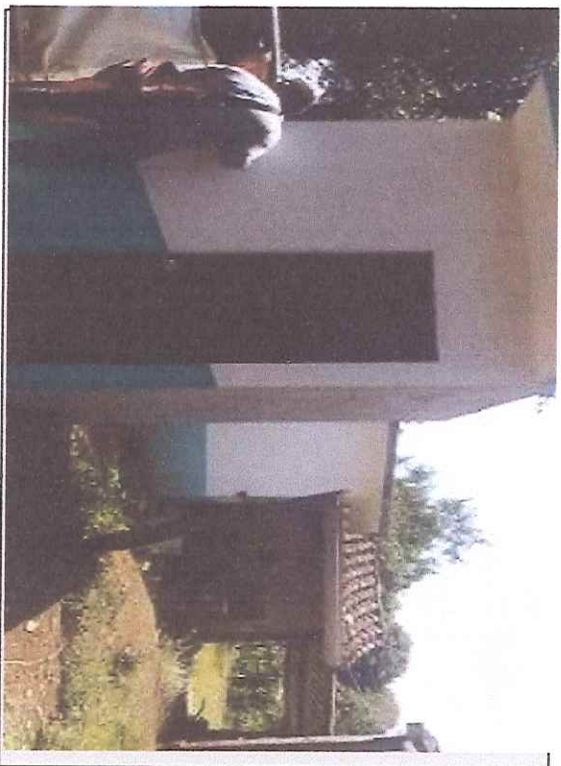

FOTO

Concepto de obra ejecutado: Pintura vinimex comex en muros con mezcla fina hasta 3.00m. de altura, incluye: una manosellador y dos de pintura, acarreos a la estación a 20.00m.

Concepto de obra ejecutado:

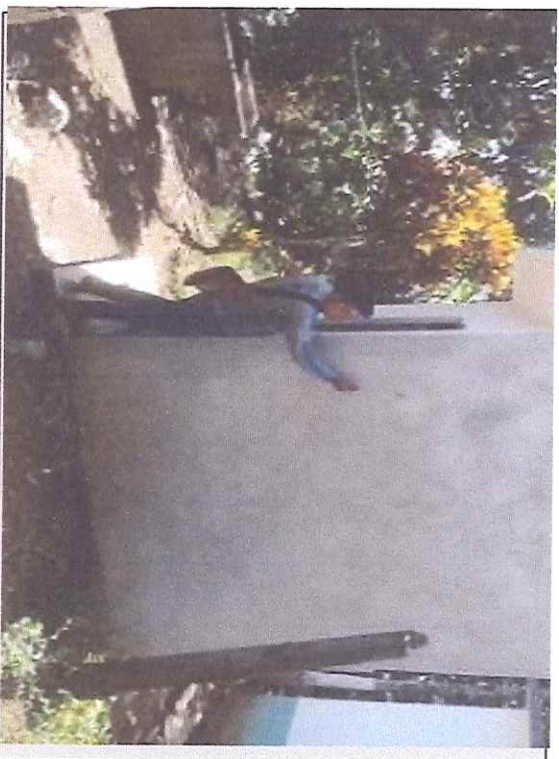

FOTO

Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Observaciones: TERMINADA Y OPERANDO



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
INGENIERO CIVIL
2019-2021

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

[FORMATO 09]

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA **Localidad:** TLACOTEPEC DE MEJÍA **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2019

No. de obra: 2019301790017 **Periodo:** SEPTIEMBRE **Número de estimación:** 1 NORMAL Y FINIQUITO

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO **Fuente de financiamiento:** DCAL MUNICIPAL Y DE LAS

TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 279 "URSULO GALVAN REYES " **Fecha de revisión:** 06/09/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Muro de 12 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado aparente, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

Concepto de obra ejecutado:

Muro de 12 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado aparente, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.



FOTO

Observaciones:
TERMINADA Y OPERANDO



OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO
INGENIERO CIVIL TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Ofiis



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

[FORMATO 09]

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA **Localidad:** AMATITLA
No. de obra: 2019301790016 **Periodo:** SEPTIEMBRE
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO
Clave: 30E1N0654Y EN AMATITLA
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
Número de estimación: 2 FINIQUITO
Fuente de financiamiento: DCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 06/09/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Muro de 12 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabadoaparente, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

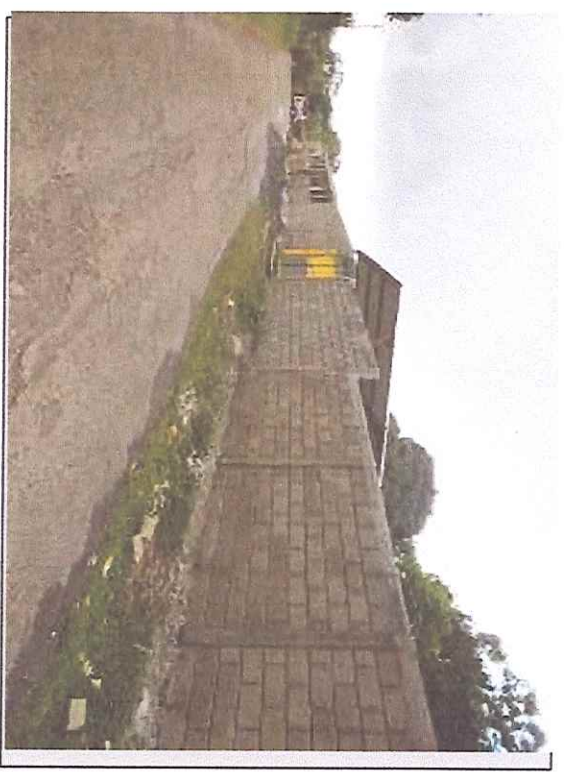

FOTO

Concepto de obra ejecutado: Muro de 12 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabadoaparente, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

TERMINADA Y OPERANDO



OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJÍA
 MIGUEL ANGEL SERRANO
 INGENIERO CIVIL
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Ofiis



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

[FORMATO 09]

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA
No. de obra: 2019301790015
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACTOPAN

Localidad: ACTOPAN
Periodo: SEPTIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
Número de estimación: 1 NORMAL
Fuente de financiamiento: DCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 06/09/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Excavación a mano en cepas material tipo "B" en seco hasta 2 mts. Incluye, afloje, extracción, amacice, limpieza de plantilla y taludes, medida en banco.

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro demateriales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.



OBRAS PUBLICAS

MIGUEL ANGEL SERRANO HERRERA
INGENIERO CIVIL
AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA
Supervisor responsable
2018-2021

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Ofiis

Observaciones:

Área reservada para las observaciones.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)**

FORMATO 09

DATOS GENERALES


Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA **Localidad:** AMATITLA
No. de obra: 2019301790013 **Periodo:** SEPTIEMBRE
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AMATITLA

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
Número de estimación: ESTIMACION 1 NORMAL
Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 10/09/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Dala desplante seccion 12 x 20cm. concreto f' c= 200 kg/cm2, r.n. ag. max. 3/4", reforzada con armex de 1.5x20-4, cimbra comun, incluye cimbra , descimbra, Yacarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m.de distancia

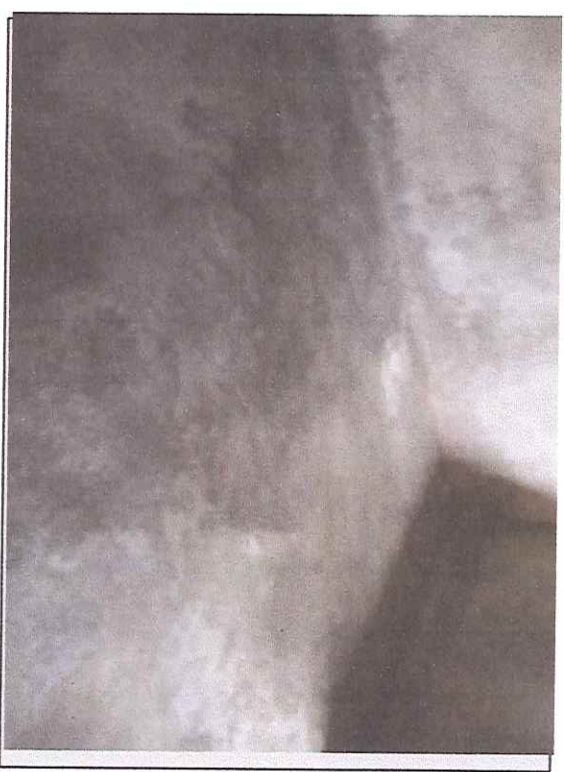

FOTO

Concepto de obra ejecutado: Piso de concreto simple de 8cm. de espesor, fabricado con concreto hecho en obra, con revolvedora, f' c= 150kg/cm2, r.n. agr. max. 40 mm. (1 1/2"), con acabadopulido, incluye acarreo de los materiales a 1a. estaciona 20m. de distancia



OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA
MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
 INGENIERO CIVIL TLACOTEPEC DE MEJÍA
 Supervisor responsable
 2018-2021

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

FORMATO 09


REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA
 Localidad: CHIXTLA
 No. de obra: 2019301790012
 Periodo: SEPTIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
 Número de estimación: STIMACION DOS FINIQUITO
 Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
 Fecha de revisión: 23/09/2019


Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTLA

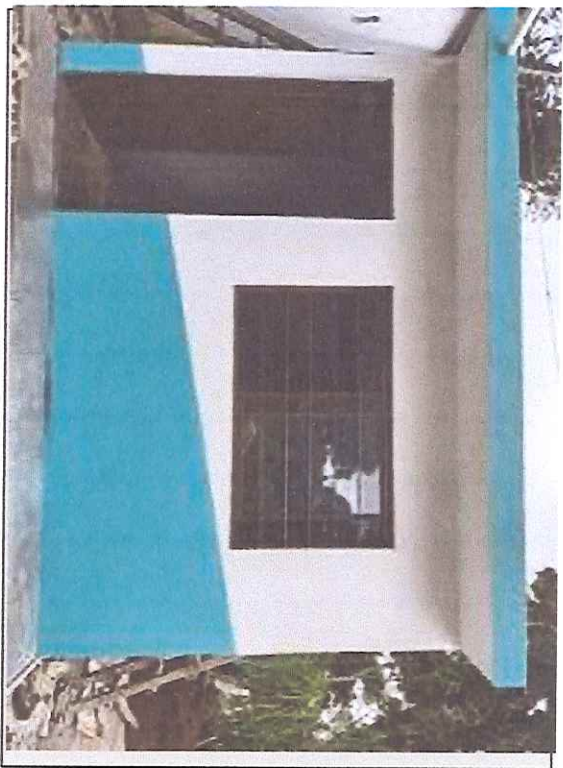

FOTO

Concepto de obra ejecutado: Losa plana en super estructura de 10cm. de peralte, fabricada con concreto f'c=200 kg/cm2, r.n. agreg. max. 20mm. (3/4"), Incluye: cimbra acabadocomún, descimbra, suministro y colocación de malla

Concepto de obra ejecutado:

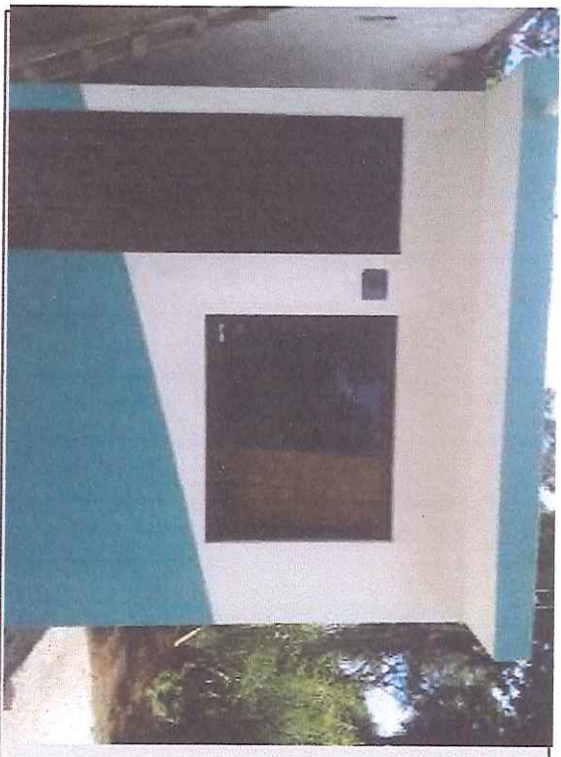

FOTO

Pintura vinimex comex en muros con mezcla fina hasta 3.00m. de altura, incluye: una mano sellador y dos de pintura, acarreos a 1a. estacion a20.00m

Observaciones: TERMINADA Y OPERANDO



OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
 INGENIERO CIVIL
 TLACOTEPEC DE MEJIA
 Supervisor responsable
 2018-2021


- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Ofi@s



REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
 No. de obra: 2019301790010 Periodo: SEPTIEMBRE Número de estimación: N/A
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZAP 0045 Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
 Fecha de revisión: 30/09/2019

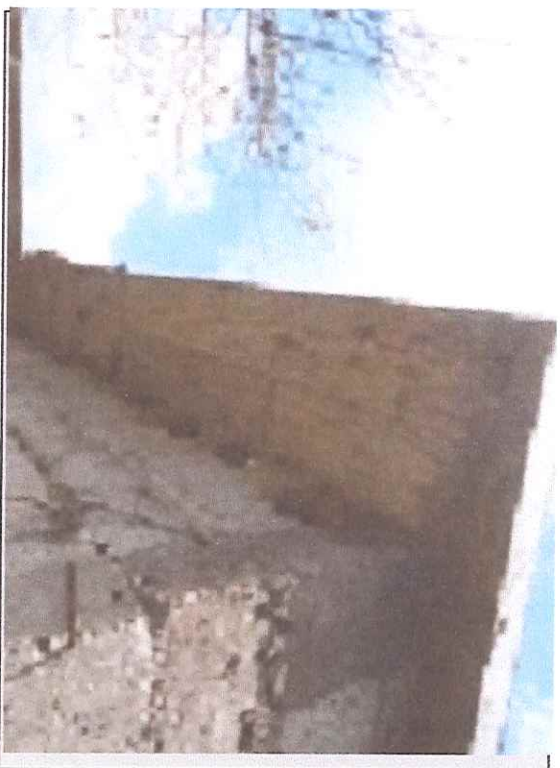


FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Losa de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm., de espesor, armado con varillas de no.3 @15cm., sentido transversal y del no.3, @20cm. sentido longitudinal, incluye suministro de concreto, pruebas de laboratorio, cimbra,

Concepto de obra ejecutado:

Losa de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm., de espesor, armado con varillas de no.3 @15cm., sentido transversal del no.3, @20cm. sentido longitudinal, incluye suministro concreto, pruebas de laboratorio, cimbra, descimbra,

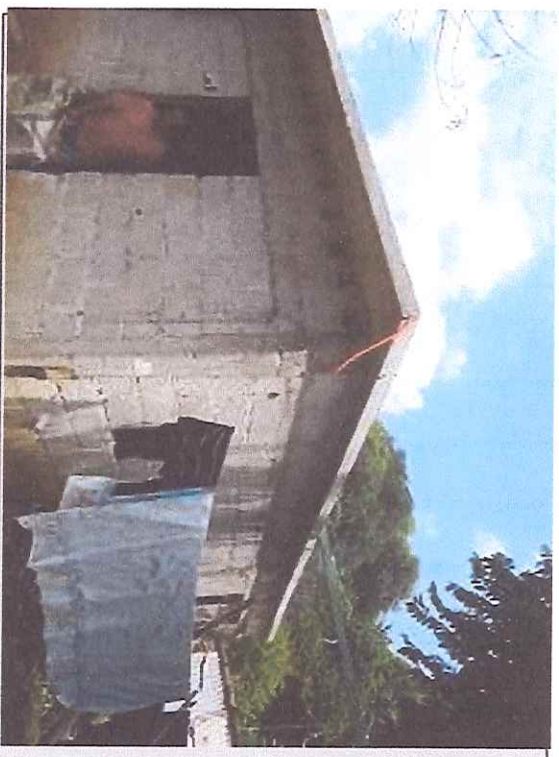

FOTO

Observaciones: TERMINADA Y OPERANDO

Observaciones:

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. OfIs

MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
 INGENIERO CIVIL
 Tlacotepec de Mejía
 Supervisor responsable
 2018-2021





REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA
No. de obra: 2019301790009 Periodo: SEPTIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
Número de estimación: N/A

Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 30/09/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Dala desplante seccion 12 x 20cm. concreto f'c= 200 kg/cm2, r.n. ag. max. 3/4", reforzadacon armex de 15x20-4, cimbra comun, incluye cimbra , descimbra, y acarreo de losmateriales a una 1a. estacion a 20.00 m. dedistancia

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Fabricación de muro de block macizo de m2 12x20x40,5. En juntas de hasta 2.5cm. Con acabadocomún. Incluye: Cimbra común y todo lo necesario para su correcta ejecución. (p.u.o.t.).



OBRAS PUBLICAS

MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA AYUNTAMIENTO
INGENIERO CIVIL TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Pùblicas
- c.c.p. Ofis

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

FORMATO 09

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TLACOTEPEC DE MEJÍA Localidad: TLACOTEPEC DE MEJÍA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
 No. de obra: 2019301790007 Periodo: SEPTIEMBRE Número de estimación: N/A
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZAP 0045 Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
 Fecha de revisión: 30/09/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Limpieza, trazo y nivelacion en terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias.

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Dala desplante seccion 12 x 20cm. concreto f'c= 200 kg/cm2, r.n. ag. max. 3/4", reforzadacon armex de 15x20 cimbra comun,incluye cimbra , descimbra, y acarreo de losmateriales a una 1a. estacion a 20.00 m. dedistancia

OBRAS PUBLICAS

MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA AYUNTAMIENTO
 INGENIERO CIVIL TLACOTEPEC DE MEJIA
 Supervisor responsable 2018-2021

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Ofiis

Observaciones:
